



Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Klimaat en Groene Groei

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Het Hogeland
t.a.v. dhr. Hans Broekhuizen
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Verstuurd per email: gemeente@hethogeland.nl
Cc: c.goelema@hethogeland.nl

Datum 19 december 2025
Betreft advies over het ontwerp programma van aanpak 2026

Geachte heer Broekhuizen,

Op woensdag 19 november 2025 heb ik per e-mail een verzoek om advies van de gemeente Het Hogeland over het ontwerp programma van aanpak 2026 ontvangen. Dit betreft een actualisatie van het programma van aanpak (hierna: PVA) van vorig jaar.

In deze brief geef ik u mijn reactie en advies over het ontwerp PVA 2026. Mijn advies licht ik daarna verder toe met een uitleg over het door mij te hanteren toetsingskader en mijn bevindingen. Afsluitend volgen enkele opmerkingen.

Reactie en advies

Mijn algemene reactie betreft het ontwerp PVA 2026 en daarin neem ik een aantal actuele zaken mee. Mijn advies aan u volgt daarna.

Ontwerp PVA 2026

Het ontwerp PVA 2026 voor de versterkingsopgave in uw gemeente is opgesteld door de lokale stuurgroep waarin de gemeente Het Hogeland, Nationaal coördinator Groningen (hierna: NCG), woningcorporaties en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: IMG) samenwerken. Dit is zeer zorgvuldig gedaan met daarin ook een duidelijke uitsplitsing per dorp. Uit alles blijkt een grote betrokkenheid van u bij de bewoners, gebruikers en eigenaren van de gebouwen in uw gemeente.

In uw 'Samenvatting van de opdracht' daagt u NCG uit om haar beoordelings- en uitvoeringscapaciteit te vergroten of de opgave te versnellen door op een slimme en inventieve manier te kijken naar mogelijkheden. Ook geeft u aan dat NCG frequent met u en de eigenaren moet communiceren over de nog te beoordelen adressen en wanneer NCG de opdracht niet volgens planning kan uitvoeren. Tegelijkertijd accepteert u een door NCG opgestelde planning voor 2026 en geeft u daarvoor opdracht. Die planning is inmiddels door NCG aangepast. Ik constateer daarom dat u in grote mate afhankelijk bent van NCG en inmiddels weinig kan bijsturen op de planning van de resterende versterkingsopgave.

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

ir. J. Pauwels

Ons kenmerk

SODM / 102660787

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Ik beoordeel het PVA volgens het wettelijk kader. Nij Begun is echter aanleiding geweest voor aanvullend beleid. Daardoor heeft NCG nog meer extra taken en werkzaamheden gekregen. De staatssecretaris Herstel Groningen (hierna: SHG) geeft duidelijk aan dat de versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. En dat voor de bewoners en eigenaren van gebouwen in de versterkingsopgave de balans tussen snelheid, kwaliteit en comfort gevonden moet worden.¹

De benodigde balans is naar mijn mening nog niet gevonden. Ik maak mij zorgen over de behaalde voortgang en de steeds verder uitlopende planning voor de resterende versterkingsopgave. Het bepalen, monitoren en bewaken van de balans is niet alleen een taak van NCG. Daarin heeft u ook een belangrijke taak en bent u medeverantwoordelijk voor het door NCG zo snel mogelijk laten realiseren van de versterkingsopgave.

Voortvarendheid en snelheid zijn nodig om alle gebouwen in de versterkingsopgave zo snel mogelijk veilig en 'op norm' te kunnen verklaren. En ook om de bewoners en eigenaren van de te versterken gebouwen die pas later aan de beurt zijn, niet nog langer te laten wachten. De bewoners en eigenaren van alle gebouwen moeten zich zo snel mogelijk veilig voelen en veilig zijn.

Actuele zaken

De aardbeving in Zeerijp op 14 november 2025 heeft het gevoel van onveiligheid onder de mensen in Groningen weer vergroot. Deze beving maakte duidelijk dat er nog steeds een kans is op zwaardere aardbevingen. In een recente brief aan de Tweede Kamer gaat de SHG hier ook op in.² Dit onderstreept nogmaals het belang van een voortvarende versterking van de gebouwen in het aardbevingsgebied. Mijn bijzondere zorg gaat uit naar die bewoners die al heel lang op versterking wachten, de zogeheten 'complexe dossiers'.

NCG is samen met de SHG een programma gestart om langlopende en vastgelopen 'complexe dossiers' met voorrang vlot te trekken. Daarin krijgt het team 'Impactvolle dossiers' van NCG een wat andere positie dan het nu heeft. Dit programma steun ik. Bewoners van te langlopende of vastgelopen dossiers kunnen als laatste redmiddel bij de al in 2014 ingestelde Commissie Bijzondere Situaties of het in 2021 gestarte onafhankelijke en zelfstandige 'Interventieteam Vastgelopen situaties' terecht. Maar dat laatste redmiddel moet naar mijn mening zoveel mogelijk voorkomen worden door de 'complexe dossiers' nu voortvarend aan te pakken. Als gemeente kunt u ook een actieve rol hebben in het afronden van de 'complexe dossiers', bijvoorbeeld door NCG te ondersteunen bij het verder inventariseren en oplossen van deze dossiers. Ik verzoek u dit ook aan te geven in het vast te stellen PVA 2026.

In de 'Staat van de Veiligheid in verband met de voormalige winning uit het Groningen-gasveld' rapporteer en adviseer ik in 2026 over de voortgang en planning voor de gehele versterkingsopgave. Dit zal ook input zijn voor het opstellen van de 'Staat van Groningen en Noord-Drenthe' in 2026 waarmee het Rijk en de regio de voortgang op de uitvoering van de maatregelen uit Nij Begun monitoren.

¹ Beleidsbrief Versterken van 24 januari 2025 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

² Kamerstuk 33529, nr. 1343, van 24 november 2025.

Advies

Ik adviseer u om het geactualiseerde PVA 2026 vast te stellen met daarin een duidelijke oproep aan NCG om meer aandacht te geven aan de benodigde voortvarendheid en snelheid in de versterkingsopgave. In het ontwerp PVA 2026 daagt u NCG uit de versterkingsopgave te versnellen. Vanuit het belang van de veiligheid onderschrijf ik uw oproep aan NCG.

Ik adviseer u om NCG te stimuleren de langlopende en vastgelopen 'complexe dossiers' met voorrang op te lossen. Aanvullend vraag ik u NCG te ondersteunen bij het verder inventariseren en oplossen van deze dossiers. Ik verzoek u dit ook aan te geven in het vast te stellen PVA 2026.

Toetsingskader

Ik ga hier eerst in op het wettelijk kader van de Tijdelijke Wet Groningen (hierna: TWG) en mijn rol als toezichthouder. Vervolgens geef ik het huidig beleid voor de versterkingsopgave aan dat ik ook meeneem in mijn advies.

Wettelijk kader

Uit de TWG volgt dat de inspecteur-generaal der mijnen binnen zes weken na het verzoek van de gemeenteraad een advies uitbrengt over het ontwerp van het PVA.³ In het Besluit Tijdelijke wet Groningen (hierna: BTWG) zijn regels gesteld over de inhoud en reikwijdte van de advisering door de inspecteur-generaal der mijnen.⁴ De inspecteur-generaal der mijnen geeft een advies in relatie tot de veiligheid.⁵ De gemeenteraad kan alleen gemotiveerd afwijken van het advies van de inspecteur-generaal der mijnen bij de vaststelling van het PVA.⁶

Uit het wettelijk kader volgt dat ik beoordeel of een PVA:

1. voldoende gericht is op het zo snel mogelijk realiseren van de versterkingsopgave; en
2. voldoet aan de genoemde voorwaarden uit artikel 10c, tweede, derde of vierde lid, van het BTWG.

Ik kijk daarbij naar wijzigingen van de scope van gebouwen en de planning van de versterkingsopgave binnen uw gemeente.

In bijlage 1 geef ik meer uitleg over de voorwaarden die gelden voor het wijzigen van de scope en de planning.

Huidig beleid

Nij Begun is aanleiding geweest voor aanvullend beleid voor de uitvoering van werkzaamheden in de versterkingsopgave. In de beleidsbrief Versterken van 24 januari 2025⁷ en in de kamerbrief voortgang herstel Groningen van 23 juni 2025⁸ wordt daar het nodige over geschreven.

In de zogeheten Agenda voor Herstel werken de vijf versterkingsgemeenten, de provincie Groningen, NCG, het IMG, en het Rijk samen aan manieren om als één

³ In dit geval betreft mijn advies de actualisatie van het PVA 2026.

⁴ Artikel 10c en 10d van het Besluit Tijdelijke Wet Groningen.

⁵ Artikel 13g, derde lid, juncto vierde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen.

⁶ Op grond van artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht.

⁷ Beleidsbrief Versterken van 24 januari 2025 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

⁸ Voortgangsbrieven Herstel-Groningen van 23 juni 2025 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

overheid proactief ondersteuning te bieden aan bewoners in het versterkingsgebied. De afhandeling van de aardbevingsproblematiek moet milder, menselijker en makkelijker worden voor de bewoners in het versterkingsgebied. Daarvoor heeft de SHG een aantal acties uitgezet en besluiten genomen. Daardoor kreeg NCG nog meer extra taken en werkzaamheden die invloed hebben op de voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave. De SHG geeft ook duidelijk aan dat de versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. Dat snelheid daarin een grote rol speelt. En dat voor de bewoners en eigenaren van gebouwen in de versterkingsopgave de balans tussen snelheid, kwaliteit en comfort gevonden moet worden. Dit moet naar mijn mening ook gelden voor de vele bewoners en eigenaren die al erg lang wachten op het versterken van hun gebouw.

In bijlage 1 geef ik meer uitleg over alle extra taken en werkzaamheden van NCG in de versterkingsopgave.

Bevindingen

Mijn bevindingen baseer ik op uw ontwerp PVA 2026 en mijn eigen analyses van de behaalde voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave.

In bijlage 2 staan een aantal overzichten met gegevens over de behaalde voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave. Daarin kunt u de aantallen adressen vinden die ik hierna in mijn bevindingen noem.

Gebruikte datasets

SodM maakt in dit advies gebruik van de door NCG online aan SodM beschikbaar gestelde datasets zoals die op 17 november beschikbaar waren:

- NCG Brondata 17-11-2025 voor de behaalde voortgang.
- MJVP versie 2025 november voor de resterende planning.
- MJVP versie 2024 november voor het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen.


Scope

De scope is volgens het ontwerp PVA 2026 in 2025 met 26 adressen toegenomen tot 2.727 adressen, met peildatum 4 september 2025. Uit de door mij gebruikte datasets kom ik op 32 in 2025 toegevoegde adressen en een totaal van 2.737 adressen.

Ik kijk ook naar de reden van het aan de scope toevoegen van adressen. In het vierde kwartaal van 2024 heeft NCG 2 adressen vanwege een administratieve wijziging toegevoegd. In 2025 zijn door NCG 2 adressen vanwege een administratieve wijziging en 30 adressen via het Loket opname op verzoek toegevoegd. In het ontwerp PVA 2026 voegt u zelf geen adressen toe aan de scope. Ik maak daarom geen bezwaar tegen de uitbreiding van de scope. In 2026 zal ik mij wel verder verdiepen in de processen waarmee NCG nog steeds adressen aan de scope toevoegt.

Voortgang

Voor de totale scope van 2.737 adressen geeft de volgende figuur aan hoeveel adressen in welke fase zitten:

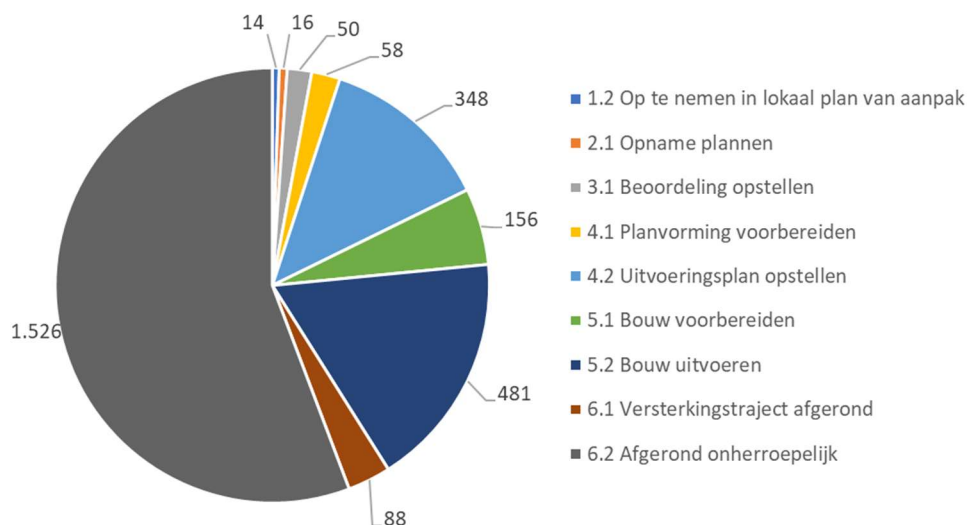

Figuur 1: aantal adressen per fase

Uit figuur 1 volgt dat er nog maximaal 1.123 adressen versterkt moeten worden. In de overzichten van bijlage 2 is te zien dat in het MJVP wordt gerekend met uiteindelijk 1.638 of wellicht 1.812 versterkte adressen. Daarvan zijn er inmiddels 596 versterkt volgens de Brondata. De verschillende datasets lopen niet helemaal synchroon en ook worden niet altijd alle mijlpalen tijdig ingevoerd. Daarom kunnen er ook beperkte verschillen in de aantallen optreden. Uit bovenstaande leid ik af dat er nog zo'n 1.042-1.123 adressen te versterken zijn in uw gemeente.

In 2025 zijn er tot nu toe 70 adressen tot mijlpaal 8 'Uitvoeringsplan gereed' en 120 adressen tot mijlpaal 11 'Bouw gereed' gebracht. In het MJVP stonden daarvoor in 2025 echter 239 respectievelijk 237 adressen gepland. Inmiddels is dat in het MJVP bijgesteld tot 106 respectievelijk 190 adressen. Uitgaande van de nu behaalde voortgang, verwacht ik niet dat de vorig jaar in het MJVP aangegeven plannings voor 2025 gehaald zullen worden. Voor de Staat van de veiligheid in verband met de voormalige winning uit het Groningen-gasveld zal ik hier nader onderzoek naar doen.

Planning

Een jaar geleden zag het er nog naar uit dat de versterkingsopgave in uw gemeente met een flinke versnelling in 2026 en 2027 in 2028 afgerond zou worden.

De planning voor 2025 is echter niet gerealiseerd en de planning voor 2026, 2027 en 2028 is daarop aangepast. In het ontwerp PVA 2026 geeft u aan dat NCG een planning voor 2026 heeft gepresenteerd. Deze planning accepteert u en u geeft NCG opdracht om deze uit te voeren. In tabel 1 van het ontwerp PVA 2026 staan 191 adressen bij mijlpaal 8 'Uitvoeringsplan gereed' en 502 adressen bij mijlpaal 11 'Bouw gereed' in 2026. In het MJVP staan daarvoor nu 261 respectievelijk nog maar 448 adressen gepland in 2026. De versterkingsopgave wordt daarmee pas in 2029 afgerond. Gezien de trend van de afgelopen jaren, verwacht ik niet dat NCG de nu in het MJVP voor mijlpaal 11 in 2026 aangegeven planning zal halen.⁹

Ik heb geen opmerkingen op de prioritering, de volgorde van het beoordelen van de gebouwen. De meeste gebouwen zijn namelijk al beoordeeld. De resterende te

⁹ Zie bijlage 2: Overzicht 1: totale scope.

beoordelen gebouwen staan op basis van een eerdere prioritering in de planning. Nieuw aan de scope toegevoegde gebouwen worden praktisch ingepland.

Opmerkingen

In de adreslijst die u heeft meegestuurd bij het ontwerp PVA 2026 staan in de operationele planning, 218 adressen bij mijlpaal 8 'Uitvoeringsplan gereed' en 559 adressen bij mijlpaal 11 'Bouw gereed' in 2026. Dat wijkt beperkt af van de aantallen in tabel 1 uit het ontwerp PVA 2026. Ik ga ervanuit dat u intern afstemt welke aantallen aan te houden.

U geeft aan de taak en handelsruimte van de lokale stuurgroep te verruimen vanuit de Agenda voor Herstel. Tegelijkertijd geeft u aan dat de rol van de stuurgroep gelijk blijft ten opzichte van het PVA. Ik ga ervanuit dat u uw eigen rol in de stuurgroep goed invult. In de TWG zijn voor het PVA namelijk duidelijke taken voor de gemeente zelf beschreven.

Afsluitend

Ik ga ervanuit dat u mijn advies in overweging neemt bij het definitief maken van het PVA 2026. Ook verzoek ik u om mij het door de gemeenteraad van Het Hogeland vastgesteld PVA 2026 toe te sturen. Of mij van de publicatie daarvan op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,



Drs. F. Kiewiet de Jonge – Lulofs

Directeur Centrale Expertise; Toezicht Groningen, Gasnetten, Olie- & gas en Wind op Zee

Bijlage 1

In deze bijlage leg ik de voorwaarden voor de scope en planning voor de versterkingsopgave uit die volgen uit de TWG. Aansluitend geef ik aan welke extra taken Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) heeft volgens de TWG en het huidige beleid.

Voorwaarden scope

In uw PVA rekent u net als NCG administratief met aantallen adressen en niet met aantallen gebouwen.¹⁰

De lijst van adressen waarmee de scope van de gebouwen in de versterkingsopgave wordt beschreven, kan om verschillende redenen wijzigen:

1. Het risicoprofiel van een gebouw buiten de scope van de versterkingsopgave is door NCG verhoogd. Voorbeelden zijn o.a.:
 - o Een gebouw waarvan de eigenaar zich heeft gemeld bij het Loket Opname op Verzoek (hierna: LOOV) en waarvoor NCG heeft besloten dat het gebouw misschien niet veilig is.
 - o Een gebouw waarvoor het IMG voor een gebouw met een 'normaal risico profiel' een acuut onveilige situatie of een aantasting van de constructieve veiligheid vanwege schade heeft vastgesteld.
 - o Een gebouw dat grote overeenkomsten heeft in opbouw en locatie met andere gebouwen in de versterkingsopgave met een 'licht verhoogd risicoprofiel' of 'verhoogd risicoprofiel'.
 - o Een gebouw dat constructief verbonden is aan een ander gebouw in de versterkingsopgave met een 'licht verhoogd risicoprofiel' of 'verhoogd risicoprofiel'.
2. Adressen van een gebouw in de scope van de versterkingsopgave kunnen zijn gewijzigd of ontbraken op de lijst. Dit betreft administratieve wijzigingen, er wordt namelijk geen gebouw aan de scope toegevoegd.
3. Een gebouw met een normaal risicoprofiel wordt gemotiveerd door NCG of de gemeente met een aangepast PVA aan de scope van de versterkingsopgave toegevoegd. Hier kan gedacht worden aan:
 - o Een gebouw dat grote overeenkomsten heeft in opbouw en locatie met andere gebouwen in de versterkingsopgave met een 'normaal risicoprofiel'.
 - o Een gebouw dat constructief verbonden is aan een ander gebouw in de versterkingsopgave met een 'normaal risicoprofiel'.
 - o Een gebouw dat erg dicht naast een ander gebouw in de versterkingsopgave staat. Gebouwen die elkaar tijdens een aardbeving kunnen raken moeten, net als constructief verbonden gebouwen, als constructieve eenheid worden beoordeeld.

NCG geeft een uitbreiding van de scope en/ of een administratieve wijziging van de adreslijst tijdig door aan de gemeente om te verwerken in een aanpassing van het PVA. Ik ga ervanuit dat NCG de gemeente ook uitleg en de motivering voor de wijziging geeft.

NCG neemt de uitbreiding van de scope van een aangepast PVA mee in de planning en werkzaamheden. In het PVA is daarvoor dan een motivering gegeven.

¹⁰ Een gebouw kan meerdere adressen bevatten, omgekeerd kan een adres ook meerdere gebouwen bevatten.

Voorwaarden planning

In de planning moet rekening gehouden worden met de risicoprofielen. In de TWG staat dat een gebouw met een hoger risicoprofiel eerder beoordeeld moet worden dan een gebouw met een lager risicoprofiel. Van deze basis prioritering kan worden afgeweken als:

1. het geen onredelijke vertraging oplevert voor de versterking van gebouwen met een hoger risicoprofiel, en dit:
 - a. de snelheid van de uitvoering van de meerjarige planning verhoogd; of
 - b. het draagvlak voor de versterking vergroot.

NCG kan de gemeente een voorstel doen om af te wijken van de basis prioritering. De gemeente kan dit ook op eigen initiatief willen doen. De gemeente moet het afwijken van de basis prioritering in het PVA motiveren. Ik ga ervanuit dat NCG de gemeente ook uitleg en de motivering voor de wijziging geeft.

Er is geen eis en ook geen streven meer om de versterkingsopgave in 2028 volledig af te ronden. Het volgende uitgangspunt voor de snelheid blijft wel van kracht:

2. De versterkingsopgave moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

De meerjarige planning van het MJVP en de bandbreedte voor de meerjarige planning die NCG in de Diepteanalyse van 2025 heeft aangegeven zijn daarin voor SodM leidend.

Extra taken en werkzaamheden in de versterkingsopgave

De primaire taak van NCG is het 'op norm' beoordelen of versterken van gebouwen.

De TWG biedt een eigenaar van een te versterken gebouw al enkele opties om extra werkzaamheden door NCG uit te laten voeren:

- De zogeheten koppelkansen, bijvoorbeeld een voorgenomen verbouwing of een aanbouw.
- Dat kan ook het herstellen van door IMG te vergoeden schade zijn.

Voorwaarde daarvoor is dat dit geen onredelijke vertraging geeft voor het 'op norm' versterken van dit gebouw of andere gebouwen in de versterkingsopgave.

Nij Begun is aanleiding geweest voor aanvullend beleid voor de uitvoering van werkzaamheden in de versterkingsopgave. De afhandeling van de aardbevingsproblematiek moet milder, menselijker en makkelijker worden voor de bewoners in het versterkingsgebied.

Dat geeft ook de volgende extra werkzaamheden in de versterkingsopgave:


- NCG heeft als taak een zwaar of middelzwaar te versterken woning volgens maatregel 28 te isoleren en, zo nodig, de ventilatie daarvoor aan te passen.
- NCG mag de eigenaar van een licht te versterken woning aanbieden om de woning volgens maatregel 29 te isoleren en, zo nodig, de ventilatie daarvoor aan te passen. NCG heeft voorafgaande aan dit besluit en na een proef ingeschat dat dit voor een adres de planvorming met 8 weken en de uitvoering met 3 weken verlengt. Maar dat de impact daarvan op de planning van de versterkingsopgave beperkt is.

- NCG kan voor een te versterken gebouw door het IMG voorgestelde maatregelen voor duurzaam herstel uitvoeren. Duurzaam herstel betreft verbeteringen aan de constructie van een gebouw om de kans op nieuwe schade te verkleinen. Daar zijn aanvullende voorwaarden aan verbonden.

De extra taken en werkzaamheden voor NCG zijn van invloed zijn op de voortgang en planning van de versterkingsopgave. Een bewoner of eigenaar komt daardoor ook voor veel keuzes te staan en accepteert wellicht een latere oplevering van het te versterken en verbeteren gebouw. De vertraging heeft echter ook gevolgen voor de bewoners en eigenaren van te versterken gebouwen die nog niet aan de beurt zijn en daardoor nog langer moeten wachten.

De staatssecretaris Herstel Groningen geeft duidelijk aan dat de versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. Dat snelheid daarin een grote rol speelt. En dat voor de bewoners en eigenaren van gebouwen in de versterkingsopgave de balans tussen snelheid, kwaliteit en comfort gevonden moet worden.

gemeente	Het Hogeland
Totale scope per fase	Aantal adressen
1.2 Op te nemen in lokaal plan van aanpak	14
2.1 Opname plannen	16
3.1 Beoordeling opstellen	50
4.1 Planvorming voorbereiden	58
4.2 Uitvoeringsplan opstellen	348
5.1 Bouw voorbereiden	156
5.2 Bouw uitvoeren	481
6.1 Versterkingstraject afgerond	88
6.2 Afgerond onherroepelijk	1.526
Eindtotaal	2.737

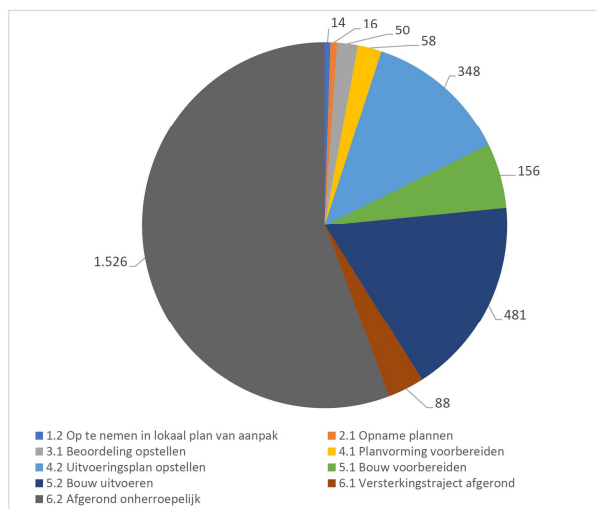


Potentieel te versterken volgens MJVP
Minimaal te versterken volgens MJVP
Gerealiseerd volgens MJVP-data
Projectplanning overgenomen in MJVP
Projectplanning MP 07/08 + Planningstool MJVP
Planningstool MJVP
Gerealiseerd volgens Bron-data

Gewogen mijlpaal 7 t/m 11	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Het Hogeland																		
MJVP versie 2024 november																		
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd						2.335	18	125	72	112	39							2.701
MP 07 Planvorming gestart	1	13	11	18	21	24	901	192	301	62	89	136						1.769
MP 08 Uitvoeringsplan gereed				1	1	7	88	91	368	440	256	239	118	30				1.639
MP 10 Bouw gestart				2	1	3	80	28	120	186	268	554	325	69				1.635
MP 11 Bouw gereed		11	3	13	6	8	40	18	115	39	248	237	455	325	118			1.636
1_REAL		11	3	13	6	8	40	18	115	39	99							352
2_LBE											149	237	443	268	117			1.214
4_MJVP													12	58	1			71
MP 12 Afgerond							86	93	205	417	527	260	368	493	198			2.647
MJVP versie 2025 november																		
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd						2.335	18	125	72	112	42	30						2.734
MP 07 Planvorming gestart	1	13	11	18	21	24	901	192	301	62	76	103	89					1.812
MP 08 Uitvoeringsplan gereed				1	1	7	88	91	368	440	171	106	261	85	25			1.645
MP 10 Bouw gestart				2	1	3	80	28	120	186	241	459	245	247	25			1.637
MP 11 Bouw gereed		11	3	13	6	8	40	18	115	39	223	190	448	287	212	25		1.638
1_REAL		11	3	13	6	8	40	18	115	39	223	114						590
2_LBE											76	448	242	195				961
3_GRIP													34	4	25			63
4_MJVP													11	13				24
MP 12 Afgerond							86	93	205	417	536	258	376	354	300	40	5	2.670
NCG Brondata 17-11-2025																		
MR 01 aan_werkvoorraad_toegevoegd_realisatie						2.335	18	125	72	112	43	32						2.737
MR 07 planvorming_gestart_realisatie	1	13	11	18	21	24	901	192	301	62	76	104						1.724
MR 08 uitvoeringsplan_gereed_realisatie				1	1	7	88	91	368	440	171	70						1.238
MR 10 bouw_gestart_realisatie				2	1	3	80	28	120	186	241	415						1.076
MR 11 bouw_gereed_realisatie		11	3	13	6	8	40	18	115	39	223	120						596
MR 12 afgerond_realisatie							86	93	205	417	535	249						1.585

Overzicht 1: totale scope

gemeente	Het Hogeland
Aangevulde scope per fase	
2.1 Opname plannen	7
3.1 Bepoordeling opstellen	27
Eindtotaal	34

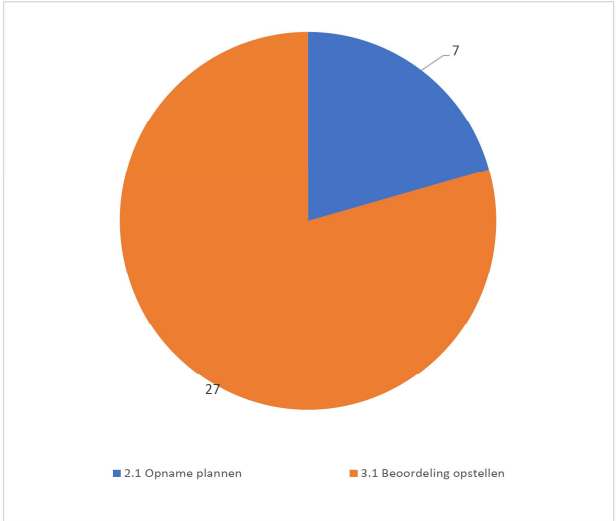

Potentieel te versterken volgens MJVP

Minimaal te versterken volgens MJVP

Gerealiseerd volgens MJVP-data

Projectplanning overgenomen in MJVP

Projectplanning MP 07/08 + Planningstool MJVP

Planningstool MJVP

Gerealiseerd volgens Bron-data

MR 01 aan_werkvoorraad_toegevoegd_realisatie

K4 2024 - K4 2025

MAANDEN

2024

2025

UG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP


OKT

NOV


DEC

Gewogen mijlpaal 7 t/m 11	2024	2025										2026	2027	2028	2029	Totaal
	11	12	01	03	04	05	07	08	09	10	11					
Het Hogeland																
MJVP versie 2025 november																
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd		1	1	4	4	5	6	4	5	1						31
MP 07 Planvorming gestart												31				31
MP 08 Uitvoeringsplan gereed												16	14	1		31
MP 10 Bouw gestart													30	1		31
MP 11 Bouw gereed													18	12	1	31
MP 12 Afgerond													16	14	1	31
NCG Brondata 17-11-2025																
MR 01 aan_werkvoorraad_toegevoegd_realisatie																
Administratieve wijziging	1	1			1				1							4
Loket opname op verzoek			1	4	3	5	6	4	5	1	1					30

Overzicht 2: aangevulde scope

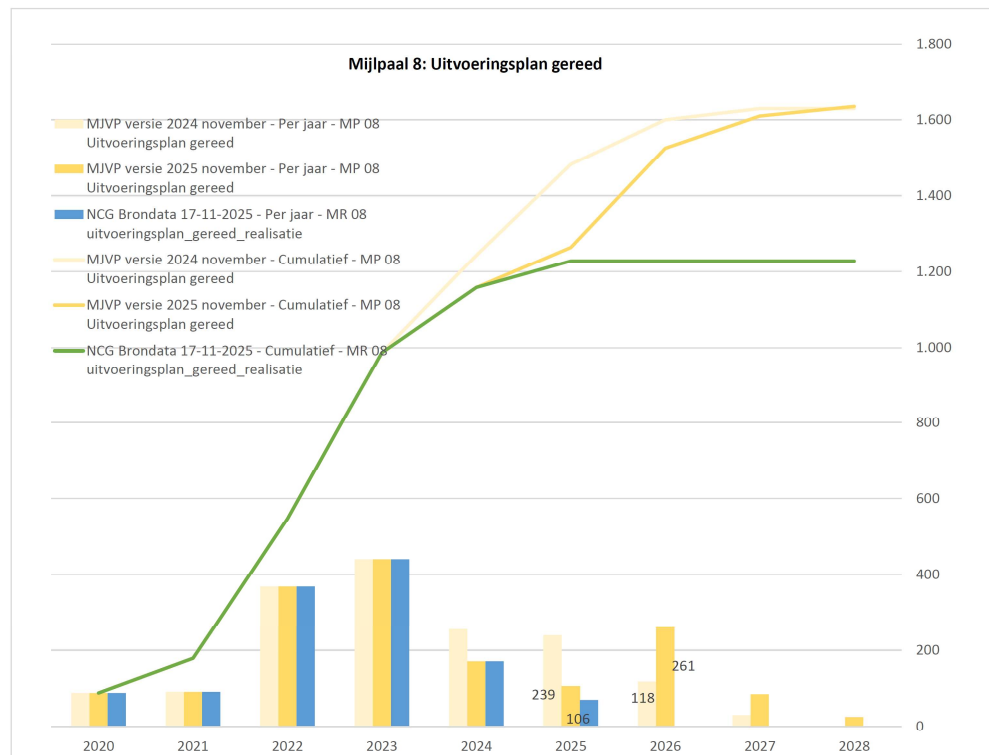

gemeente Het Hogeland

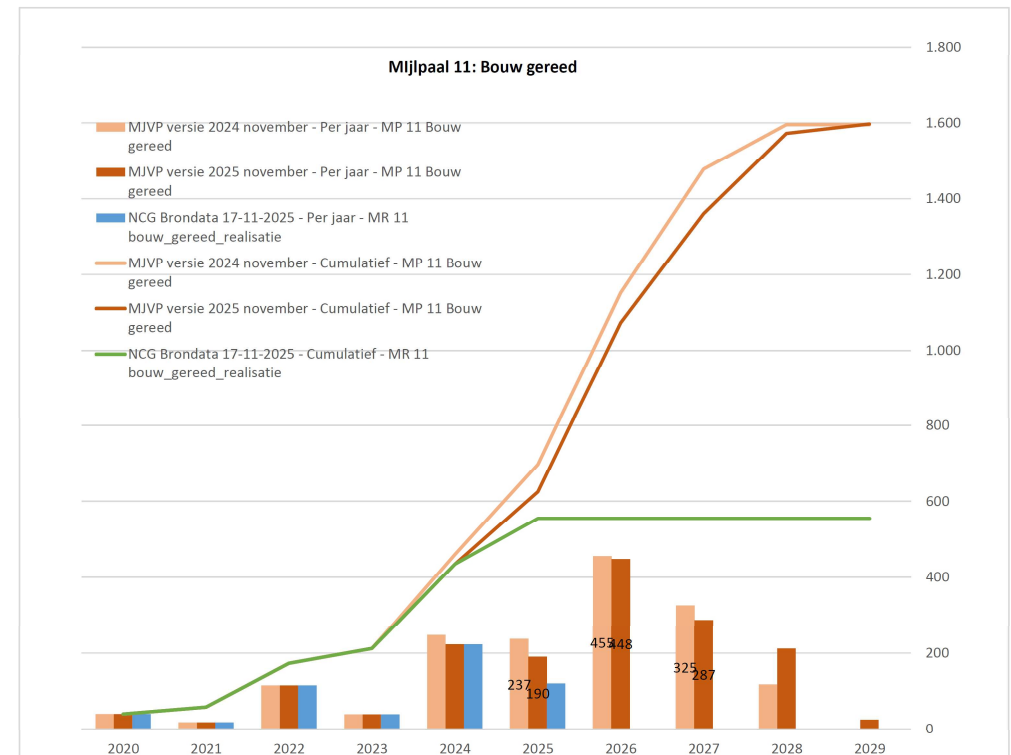

gemeente Het Hogeland

Overzicht 3: Behaalde en MJVP geplande mijlpaal 8 en 10 vanaf 2020
